



กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

รายงานผลการติดตาม ประเมินการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ

ประจำปีงบประมาณ 2564 (สปกม.)



กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนางองค์กร
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค

รายงานผลการติดตาม ประเมินการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติราชการ

ประจำปีงบประมาณ 2564
(สปคม.)



ที่ปรึกษา

นายแพทย์สุทัศน์ โชตนะพันธ์
นายสุขสันต์ จิตติมณี

คณะผู้จัดทำ

นางสาวสุพัตนา เจริญกุล
นางสาวมัณฑนา สีนทรัพย์
นางสาวอารีย์ มีคุณ
นางสาววิลาสินี คำเอี่ยม
นางสาวกาญจนา เผ่าพันธ์

เรียบเรียงเนื้อหาและออกแบบโดย

นางสาวณัฐนิชา อ่อนคล้าย

จัดทำและเผยแพร่


กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
กรมควบคุมโรค

ข้อมูลการติดต่อ (Contact)

 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข
24/56 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์
เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220

 โทร 0-2521-0943
แฟกซ์ 0-2521-0936

 E-mail iudc.strategy@gmail.com



คำนำ

การเติบโตของประชากรในเขตเมืองสำหรับประเทศไทยนั้นมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้น จากความเป็นเมืองที่เพิ่มขึ้นในแต่ละพื้นที่ ประชากรที่หนาแน่น รวมไปถึงพื้นที่ที่จำกัด ทำให้การเข้าถึงการรักษาพยาบาลเป็นไปได้ยาก ไม่ทั่วถึง และเท่าเทียม อีกทั้งยังขาดแคลนหน่วยงานรัฐที่เข้าไปศึกษาวางระบบเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรม

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองทำงานภายใต้แผนพัฒนาเกลไก การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ซึ่งการดำเนินการต่างๆ มีบทบาทภารกิจในการผลิตและพัฒนาางานวิจัย นวัตกรรม เทคโนโลยี รูปแบบ มาตรการ หลักสูตรการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่ได้มาตรฐาน สร้างและพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ห้องปฏิบัติการทางการแพทย์ แสงหาและสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่เขตเมืองได้รับการเฝ้าระวัง ควบคุมโรค และภัยสุขภาพอย่างทั่วถึง และเท่าเทียม จึงได้การดำเนินงานโครงการ จัดทำขึ้นภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร หวังเป็นอย่างยิ่งว่า รายงานผลการติดตาม ประเมินการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จะช่วยในการพัฒนาแผนการดำเนินงานโครงการ และขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

กลุ่มยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง



สารบัญ

บทที่	หน้า
คำนำ	ก
สารบัญ	ข
1 บทนำ	1
1.1 วัตถุประสงค์	3
1.2 วิธีดำเนินการ	3
1.3 ขอบเขตการประเมินผล	3
1.4 เกณฑ์การประเมินความสำเร็จของโครงการ	4
2 ข้อมูลทั่วไปของโครงการ	5
2.1 งบประมาณโครงการ	6
2.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ	9
2.3 กิจกรรมโครงการ	13
3 การบริหารโครงการ	15
3.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ	16
3.2 การปรับแผนโครงการ	17
4 ผลการดำเนินงานโครงการ	19
4.1 ผลการดำเนินงานจากระบบ Estimates SM	20
4.2 ผลการประเมินผลผลิตการดำเนินโครงการ	22
4.3 ผลดำเนินงานโครงการตามจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2563 – 2564 (4 เสาหลัก)	37
5 บทสรุป	47
5.1 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินงานโครงการ	50
5.2 ข้อเสนอแนะการดำเนินงานโครงการ	50





บทนำ



บทที่ 1

บทนำ

การดำเนินงานการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรค และภัยสุขภาพเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง (สปคม.) ได้จัดทำแผนปฏิบัติการซึ่งให้ความสำคัญกับการดำเนินงานที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ด้านการป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพ (พ.ศ. 2561 – 2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ (พ.ศ. 2561 – 2565) แผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560–2564) แผนปฏิรูปประเทศ นโยบายสำคัญของรัฐบาล และกรมควบคุมโรค การบูรณาการงบประมาณภาพรวม และกำหนดแผนบูรณาการ 14 แผนงาน การขับเคลื่อนนโยบาย Thailand 4.0 ขึ้นตามพันธกิจของสปคม. และจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2563 – 2564 (4 เสาหลัก)

แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สปคม. มีโครงการทั้งหมดจำนวน 19 โครงการ วงเงินงบประมาณ 13,169,601.28 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) แบ่งเป็น โครงการที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินประจำปีงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 12,287,160.00 บาท (สิบสองล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) และโครงการที่ได้รับการอนุมัติระหว่างปีงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) พื้นที่กรุงเทพมหานคร 2. โครงการการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์สู่ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการ มาตรฐานสากล ISO15189 และ ISO15190 3. โครงการการตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกโดยรถตรวจโรคติดต่อเชื้อซิกาในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย โดยทั้ง 3 โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 882,441.28 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)

การประเมินผลการดำเนินงานโครงการเป็นสิ่งสำคัญในการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และแผนงาน เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับพัฒนาแผนงาน และการบริหารจัดการโครงการในอนาคต

1.1 วัตถุประสงค์

เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้แผนปฏิบัติการ ราชการ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.2 วิธีดำเนินการ

การติดตาม รวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ ได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังต่อไปนี้

1.2.1 กำหนดกรอบ และจัดทำเกณฑ์สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการฯ

1.2.2 รวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ โดยแบบฟอร์มติดตามการปรับแผน และข้อมูลจากระบบ Estimates SM

1.2.3 วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ผลการดำเนินงานศึกษารายละเอียดรายโครงการ และจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และงานสนับสนุนด้านการบริหารทรัพยากร และพัฒนาองค์กร

1.2.4 สรุปผล และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานแก่บุคลากรสพคม. และผู้เกี่ยวข้อง

1.3 ขอบเขตการประเมินผล

ประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการราชการ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



1.4 เกณฑ์การประเมินความสำเร็จของโครงการ

การประเมินผลโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ ประเมินผลจากความสำเร็จของผลผลิตโครงการโดยใช้เกณฑ์การประเมินที่กำหนดขึ้น แบ่งออกเป็น 3 กลุ่มดังนี้

ตารางที่ 1 เกณฑ์การประเมินความสำเร็จของโครงการ

ผลผลิตโครงการ	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
ดำเนินการแล้วเสร็จได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง	100
ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง	50
ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19	0





ข้อมูลทั่วไป ของโครงการ




ข้อมูลทั่วไปของโครงการ

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 19 โครงการ วงเงินงบประมาณ 13,169,601.28 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหก ร้อยเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) แบ่งเป็น โครงการที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินประจำปี งบประมาณ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 12,287,160.00 บาท (สิบสองล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) และโครงการที่ได้รับการอนุมัติระหว่างปีงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ โดยทั้ง 3 โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 882,441.28 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์)

2.1 งบประมาณโครงการ

งบประมาณที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองได้รับการจัดสรรในงบดำเนินงานโครงการ แบ่งออกเป็น 2 วัตถุประสงค์ของการใช้จ่ายงบประมาณ โดยงบประมาณส่วนใหญ่มักจะถูกใช้เพื่อดำเนินงานโครงการ เพื่อให้ประชาชนได้รับการป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ภายใต้แผนงานพัฒนาระบบกลไก การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 9,982,927.28 บาท (เก้าล้านเก้าแสนแปดหมื่นสองพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) และอีกวัตถุประสงค์หนึ่งคือ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานโครงการ 3,186,674.00 บาท (สามล้านหนึ่งแสนแปดหมื่นหกพันหก ร้อยเอ็ดสิบสี่บาทถ้วน) ซึ่งงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรตอนสิ้นปีงบประมาณ แตกต่างจากงบประมาณที่ได้รับการอนุมัติและจัดสรรต้นปี 882,441.28 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) รายละเอียดความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร และหลังโอนเปลี่ยนแปลงแยกตามรายโครงการดังรูปที่ 1



จากรูปที่ 1 แสดงให้เห็นว่าความแตกต่างระหว่างงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร
ในต้นปีงบประมาณ และหลังโอนเปลี่ยนแปลง สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่

- กลุ่มโครงการที่มีงบประมาณเพิ่มขึ้น (กรอบสีเหลือง) มีด้วยกันทั้งหมด 8 โครงการเป็นโครงการที่ดำเนินงานเกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการองค์กร บุคลากร และงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านการแพทย์และสาธารณสุขจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามสถานการณ์การระบาดของโรคทำให้มีการปรับแผน และใช้จ่ายงบประมาณในด้านนี้จำนวนมาก ทำให้งบประมาณไม่เพียงพอ ทำให้เกิดการปรับแผน และการขออนุมัติโครงการเพิ่มระหว่างปีงบประมาณ

- กลุ่มโครงการที่มีงบประมาณคงเดิม (กรอบสีเขียว) มีด้วยกัน 3 โครงการ เป็นโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่ไม่ใช่ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยทั้ง 3 โครงการนี้เป็นโครงการที่มีแผนในการใช้จ่ายงบประมาณให้เสร็จสิ้นตั้งแต่ต้นปีงบประมาณ

- กลุ่มโครงการที่มีงบประมาณลดลง (กรอบสีแดง) มีทั้งหมด 8 โครงการเป็นโครงการตามบทบาทภารกิจหน่วยงาน และจุดเน้นกรม และเป็นโครงการที่มีการลงพื้นที่ การประชุมราชการ การประชุมเชิงปฏิบัติการเป็นหลัก ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ส่งผลกระทบต่อการดำเนินโครงการ ไม่สามารถดำเนินกิจกรรม และใช้จ่ายงบประมาณได้ตามแผนที่วางไว้ รวมทั้งปรับรูปแบบกิจกรรมให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้นทำให้บางกิจกรรมไม่จำเป็นต้องใช้งบประมาณ ทำให้มีการปรับแผนแล้วลดงบประมาณไปให้โครงการที่ปฏิบัติงานตอบโต้ภาวะฉุกเฉินการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019



จากงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรนั้น เมื่อนำงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรแบ่งออกเป็น 5 วงเงินงบประมาณ พบว่า ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง วงเงินงบประมาณได้รับการจัดสรรสำหรับงบดำเนินงานโครงการมากที่สุด คือ วงเงินงบประมาณตั้งแต่ 100,001 บาท จนถึง 500,000 บาท รวม 7 โครงการ (ร้อยละ 36.84) รองลงมา คือ วงเงินงบประมาณน้อยกว่าเท่ากับ 100,000 บาท จำนวน 6 โครงการ (ร้อยละ 31.58) และที่วงเงินงบประมาณที่มีโครงการน้อยที่สุดมี 2 ช่วง คือ วงเงินงบประมาณตั้งแต่ 500,001 บาท จนถึง 1,000,000 บาท และวงเงินงบประมาณมากกว่า 2,000,000 บาท ช่วงละ 1 โครงการ (แต่ละวงเงินงบประมาณคิดเป็นร้อยละ 5.26) รายละเอียดตามตารางที่ 2

ตารางที่ 2 จำนวนโครงการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองตามวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรภายใต้แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ
≤100,000	6 (ร้อยละ 31.58)
100,001 – 500,000	7 (ร้อยละ 36.84)
500,001 – 1,000,000	1 (ร้อยละ 5.26)
1,000,001 – 2,000,000	4 (ร้อยละ 21.05)
≥2,000,001	1 (ร้อยละ 5.26)

2.2 ผู้รับผิดชอบโครงการ

สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีการปรับเปลี่ยนโครงสร้างองค์กรหลายครั้ง ทำให้มีการปรับเปลี่ยนผู้รับผิดชอบโครงการเปลี่ยนแปลงจากต้นปีงบประมาณ โดยผู้รับผิดชอบโครงการจะพิจารณาจากบทบาท และพันธกิจของกลุ่มงานเป็นหลัก เมื่อสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แต่ละโครงการมีผู้รับผิดชอบตามกลุ่มงาน และงบประมาณที่ได้รับดังตารางที่ 3 ซึ่งรายละเอียดมีดังต่อไปนี้

ตารางที่ 3 รายละเอียดกลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ลำดับ	กลุ่มงาน	จำนวนโครงการ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1	กลุ่มขับเคลื่อนนโยบายและสื่อสารสุขภาพเขตเมือง	4	7.1	โครงการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ดร. สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมพระนราธิวาสราชนครินทร์	100,000.00
			7.4	โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเรือนจำ ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	172,600.00
			8.1	โครงการสื่อสารความเสี่ยงและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตเมือง ปี 2564	390,300.00
			9.1	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย	1,560.00
		รวม			664,460.00
2	กลุ่มชั้นสูตรสารารณสุข	2	1.1	โครงการการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงทาง การแพทย์สู่ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการ มาตรฐานสากล ISO15189 และ ISO15190	130,900.00
			3.1	โครงการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดที่เป็นปัญหาในเขตเมือง พ.ศ.2564 (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์)	1,594,940.00
		รวม			1,725,840.00

ตารางที่ 3 รายละเอียดกลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ลำดับ	กลุ่มงาน	จำนวนโครงการ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
3	กลุ่มติดตามมาตรฐานและรูปแบบบริการสุขภาพเขตเมือง	2	1.1	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขต่างด้าว (อสต.) พื้นที่กรุงเทพมหานคร	155,486.00
			5.2	โครงการการตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกโดยรถตรวจโรคติดต่อซีสต์ในชุมชนในพื้นที่เสี่ยงของประเทศ ไทย	1,643,433.06
		รวม			1,798,919.06
4	กลุ่มบริหารเวชภัณฑ์และโลจิสติกส์	2	4.1	โครงการสนับสนุนค้นหาและคัดกรองโรคเรื้อรังและสนับสนุนการรักษาและควบคุมโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช้ยาฯ)	1,309,970.00
			8.1	โครงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในเขตเมืองปีงบประมาณ 2564 (จัดซื้อยาฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์)	281,764.00
		รวม			1,591,734.00
5	กลุ่มนวัตกรรมคลินิกเขตเมือง	1	10.1	โครงการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตราย ปี 2564	100,000.00
6	กลุ่มเฝ้าระวังและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน	3	2.4	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่เขตเมืองของประเทศ ปีงบประมาณ 2564	286,300.00
			8.1	โครงการเตรียมความพร้อมการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ระลอกสอง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่เขตเมือง	1,866,983.46

ตารางที่ 3 รายละเอียดกลุ่มงานที่รับผิดชอบดูแลโครงการ และงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร

ลำดับ	กลุ่มงาน	จำนวนโครงการ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	งบประมาณ (บาท)
			8.2	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558	41,350.00
		รวม			2,194,633.46
7	กลุ่มพัฒนาเครือข่ายสุขภาพเขตเมือง	1	1.1	โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้านการป้องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยในพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า	641,329.80
8	กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร	1	2.2	โครงการพัฒนาองค์กร และพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 4.0	146,200.00
9	กลุ่มบริหารทั่วไป	1	1.1	โครงการบริหารจัดการทรัพยากรประจำปีงบประมาณ 2564	4,163,558.96
10	ศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยพัฒนา	2	1.1	โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	63,656.00
			1.1	โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสาธารณสุข	79,270.00
		รวม			142,926.00
11	กลุ่มกฎหมาย	0	-	-	-
รวม		19 โครงการ			13,169,601.28




2.3 กิจกรรมโครงการ

โครงการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ภายใต้แผนปฏิบัติการกรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จำนวน 19 โครงการ มีจำนวนกิจกรรมที่ถูกระบุไว้ในโครงการมากที่สุดคือ 9 กิจกรรมต่อโครงการ น้อยที่สุดคือ 1 กิจกรรมต่อโครงการ โดยจำนวนโครงการที่มีความนิยมสูงสุดคือ 4 กิจกรรมต่อโครงการ (ร้อยละ 31.58) รายละเอียดตามตารางที่ 4 เมื่อศึกษารายละเอียดแต่ละกิจกรรมที่ระบุไว้แล้วนั้น สามารถแบ่งประเภทของกิจกรรมออกเป็น 7 ประเภทหลัก ได้แก่ กิจกรรมที่สนับสนุนการดำเนินงาน กิจกรรมที่จัดทำฐานข้อมูล กิจกรรมที่เป็นการจัดซื้อจัดจ้าง หรือจ้างเหมาต่างๆ กิจกรรมที่เป็นการสรุป วิเคราะห์ ประเมิน ติดตามผลโครงการและถอดบทเรียน กิจกรรมประชุมราชการ กิจกรรมการประชุมเชิงปฏิบัติการ ฝึกอบรม และพัฒนาศักยภาพ และกิจกรรมลงพื้นที่หรือเป็นกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ ซึ่งกิจกรรมประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ กิจกรรมลงพื้นที่หรือเป็นกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติ 17 กิจกรรม (ร้อยละ 24.29) และกิจกรรมที่นิยมน้อยที่สุด คือ กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน 3 กิจกรรม (ร้อยละ 4.29) รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 2

ตารางที่ 4 จำนวนกิจกรรมที่ถูกระบุไว้ในโครงการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

จำนวนกิจกรรม	จำนวนโครงการ	ร้อยละ
1	2	10.53
2	3	15.79
3	4	21.05
4	6	31.58
6	1	5.26
7	1	5.26
8	1	5.26
9	1	5.26
รวม	19	100.00

เปรียบเทียบประเภทกิจกรรมที่ระบุไว้ในโครงการ

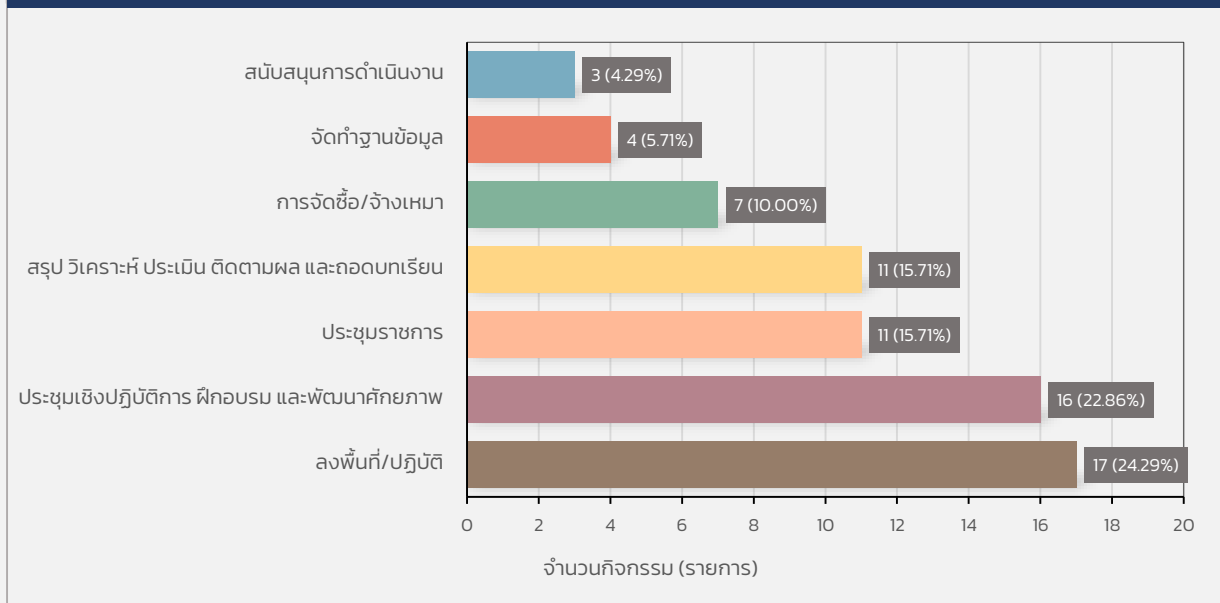

รูปที่ 2 ประเภทกิจกรรมของโครงการ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



การบริหารโครงการ




บทที่ 3

การบริหารโครงการ

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในประเทศไทย โดยเฉพาะพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเขตเมืองต่างๆ ที่มีการระบาดอย่างเป็นวงกว้างและรุนแรง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถานการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบต่อผลการดำเนินงานโครงการอย่างมาก สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จึงได้มีการบริหารจัดการโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ โดยการปรับแผนโครงการ และขออนุมัติโครงการใหม่ระหว่างปีงบประมาณให้ตอบสนองต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นให้มากที่สุด

3.1 ความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการ

ในภาพรวมของการดำเนินงานโครงการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ผลการดำเนินงานในไตรมาสที่ 1 (ตุลาคม – ธันวาคม 2563) และไตรมาสที่ 2 (มกราคม – มีนาคม 2564) มีร้อยละความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการมากกว่าแผนที่ตั้งไว้ ส่วนในไตรมาสที่ 3 (เมษายน – มิถุนายน 2564) มีร้อยละความก้าวหน้าไม่ตรงตามแผนที่ได้วางไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่เริ่มมีการระบาดระลอกสอง ในพื้นที่กรุงเทพมหานครอย่างรุนแรง จึงส่งผลกระทบต่อภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการของหน่วยงาน เนื่องจากโครงการและกิจกรรมที่วางแผนไว้ไม่สามารถดำเนินการได้ เช่น กิจกรรมการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การลงพื้นที่ต่างๆ ส่วนในไตรมาสสุดท้าย ไตรมาสที่ 4 (กรกฎาคม – กันยายน 2564) มีผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนที่วางไว้เช่นกัน แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ดีขึ้นประกอบกับการปรับแผนในช่วงไตรมาส 3 และ 4 ทำให้ผลการดำเนินงานมีความก้าวหน้าจากไตรมาสที่ 3 มากขึ้น รายละเอียดร้อยละความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการ ตามรูปที่ 3

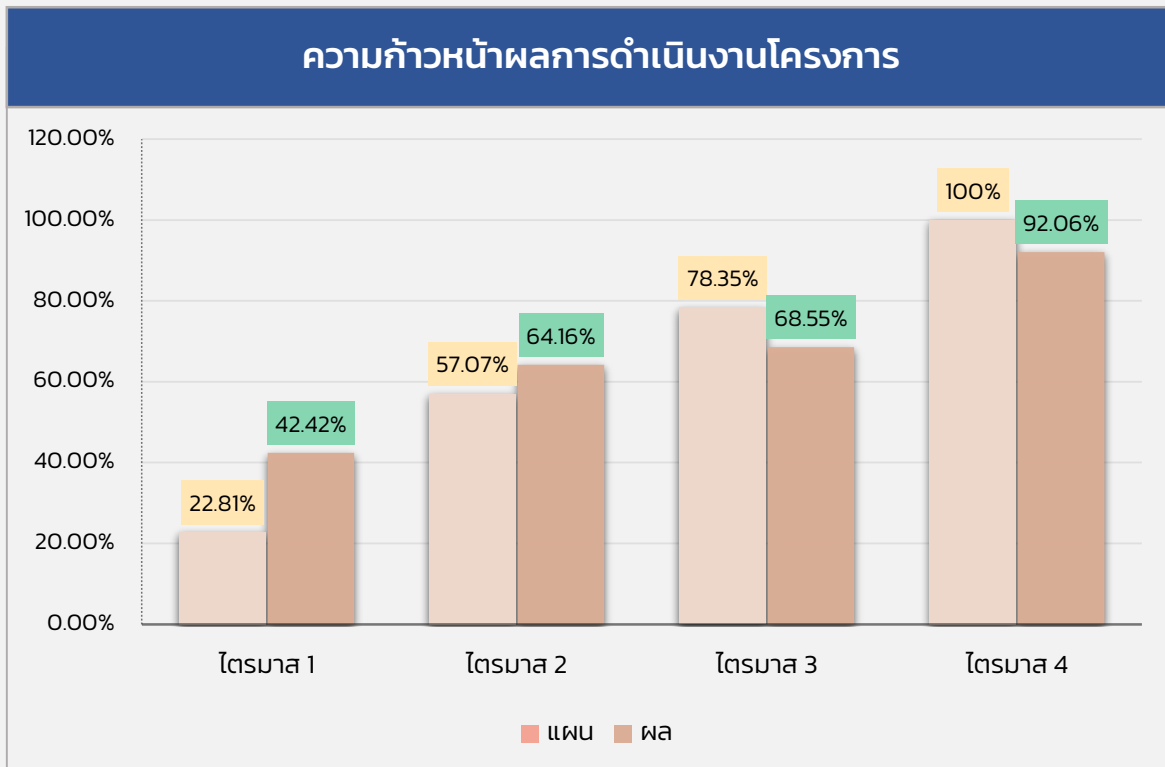


ที่มา : ข้อมูลจากระบบ Estimates SM


รูปที่ 3 ความก้าวหน้าผลการดำเนินงานโครงการแยกตามรายไตรมาส

3.2 การปรับแผนโครงการ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้มีการบริหารโครงการดำเนินการขออนุมัติปรับแผนฯ จำนวน 88 ครั้ง เมื่อพิจารณารายไตรมาสพบว่า แนวโน้มการปรับแผนเพิ่มขึ้นตามไตรมาส จากไตรมาสที่ 1 ถึง 4 ซึ่งการปรับแผนในไตรมาสที่ 4 นั้นสูงถึง 47 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 53.4 จากทั้งหมด รายละเอียดแสดงดังรูปที่ 4 และเมื่อศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมจากการปรับแผนพบว่ารูปแบบการปรับแผนที่มีการปรับมากที่สุดคือการปรับงบประมาณระหว่างโครงการจำนวน 28 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 31.8 รองลงมาคือ การปรับงบประมาณภายใต้โครงการย่อยเดียวกันจำนวน 22 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 25 และที่น้อยที่สุดคือ การขออนุมัติโครงการนอกแผน จำนวน 4 ครั้ง คิดเป็นร้อยละ 4.5 รายละเอียดตามรูปที่ 5

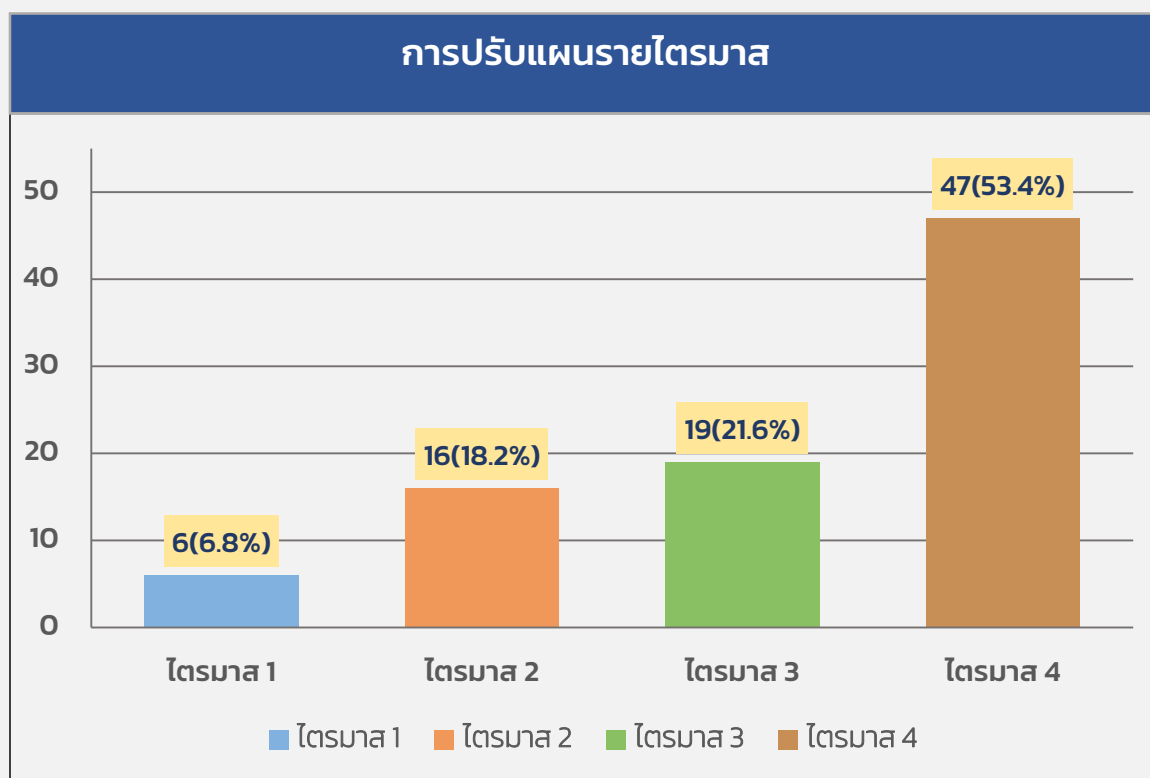

รูปที่ 4 การเปรียบเทียบการปรับแผนรายไตรมาส

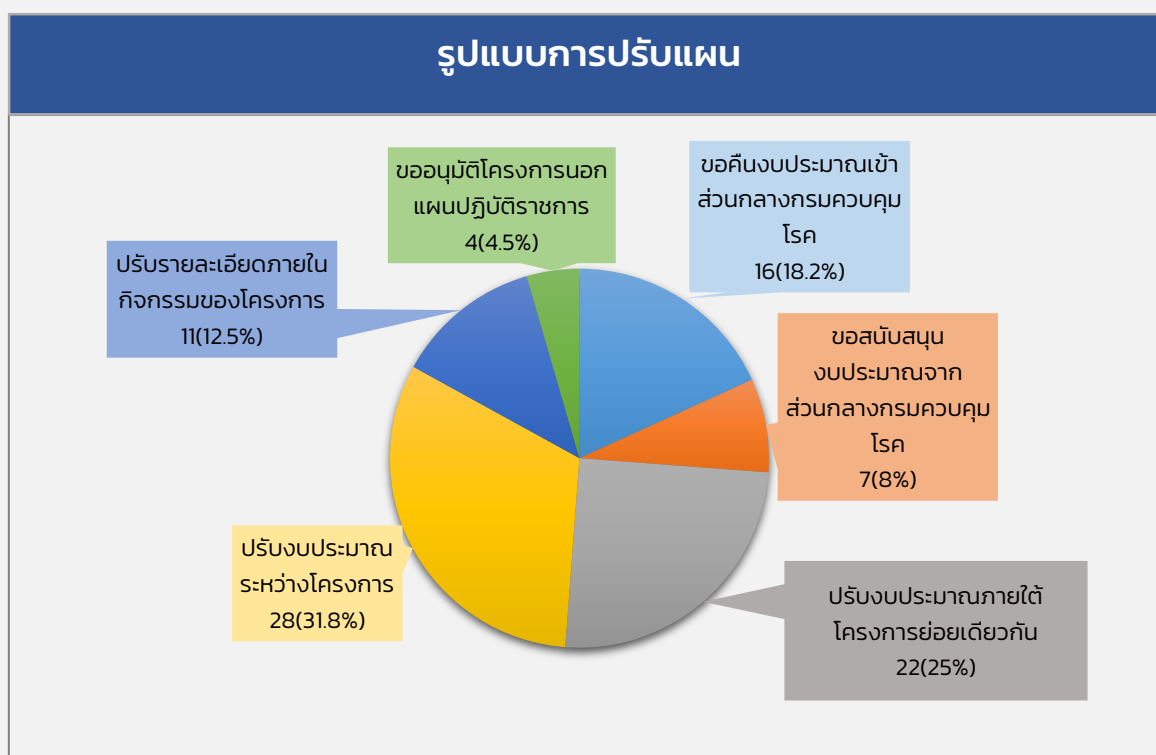

รูปที่ 5 รูปแบบการปรับแผนฯ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564



ผลการดำเนินงาน โครงการ




ผลการดำเนินงานโครงการ

จากการบริหารโครงการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้มีผลการดำเนินงานโครงการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองผ่านไปด้วยดี แต่อาจมีบางโครงการที่ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และบทบาทหน้าที่ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่ต้องเข้าไปดำเนินการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานการณ์ฉุกเฉินนั้น ซึ่งผลการดำเนินโครงการมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

4.1 ผลการดำเนินงานจากระบบ Estimates SM

ผลการดำเนินงานโครงการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ข้อมูลจากระบบ Estimates SM ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 พบว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ 92.06 และโครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 คงเหลือโครงการที่ดำเนินการยังไม่ได้ตามเป้าหมายจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 96.65 2) โครงการการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์สู่ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตามข้อกำหนดด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการ มาตรฐานสากล ISO15189 และ ISO15190 ความก้าวหน้าการดำเนินงานร้อยละ 92.00 3) โครงการตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกโดยรถตรวจโรคติดต่อเชื้อซoonิรภัย ในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 88 4) โครงการเตรียมความพร้อมการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ระลอกสอง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่เขตเมือง ความก้าวหน้าการดำเนินงาน ร้อยละ 88.20 รายละเอียดดังรูปที่ 6

ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

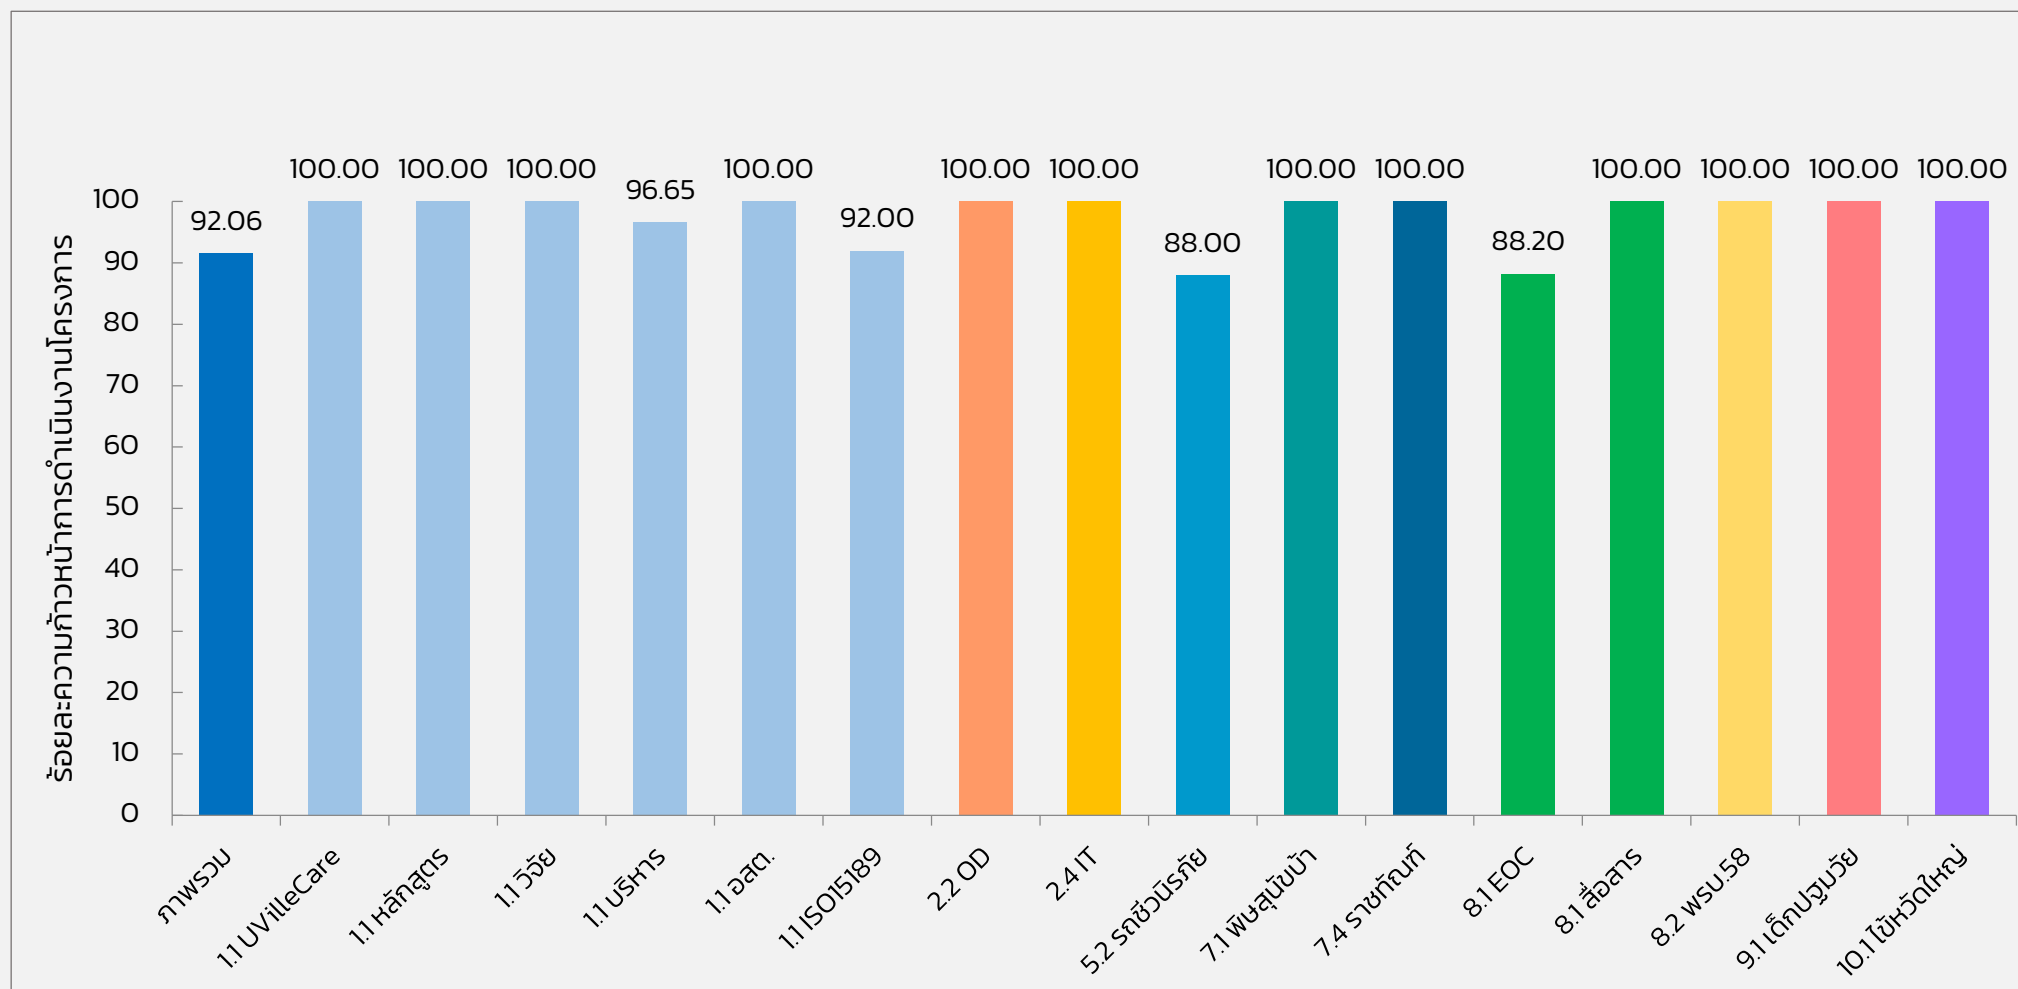


ที่มา : ข้อมูลจากระบบ Estimates SM ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564

รูปที่ 6 ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

4.2 ผลการประเมินผลผลิตการดำเนินงานโครงการ

จากการดำเนินงานโครงการทั้ง 19 โครงการ พบว่าภาพรวมของร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการอยู่ที่ร้อยละ 92.06 โดยมีจำนวน 15 โครงการที่ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการเท่ากับร้อยละ 100 ซึ่งหมายความว่าสามารถดำเนินงานโครงการแล้วได้ผลผลิตตามที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน และคงเหลือโครงการที่ดำเนินการยังไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมายจำนวน 4 โครงการ ได้แก่ 1) โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการเท่ากับ 66.67 2) โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเรือนจำ ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑ์ ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์ ได้ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการเท่ากับ 50.00 3) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558 ได้ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการเท่ากับ 50.00 และ 4) โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวัง ป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย ได้ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการเท่ากับ 25.00 ทั้ง 4 โครงการได้ดำเนินการโครงการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวังไว้ เนื่องมาจากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ไม่สามารถลงพื้นที่เข้าไปดำเนินงานให้ได้ผลผลิตตามที่คาดหวัง อีกทั้งการปรับรูปแบบการดำเนินงานตามสถานการณ์ที่เกิดขึ้นทำให้ไม่สามารถเกิดผลผลิตบางตัวได้ รายละเอียดร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการรายละเอียดดัง รูปที่ 6 และรายละเอียดการประเมินผลร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการตามตารางที่ 5 ดังนี้

ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ

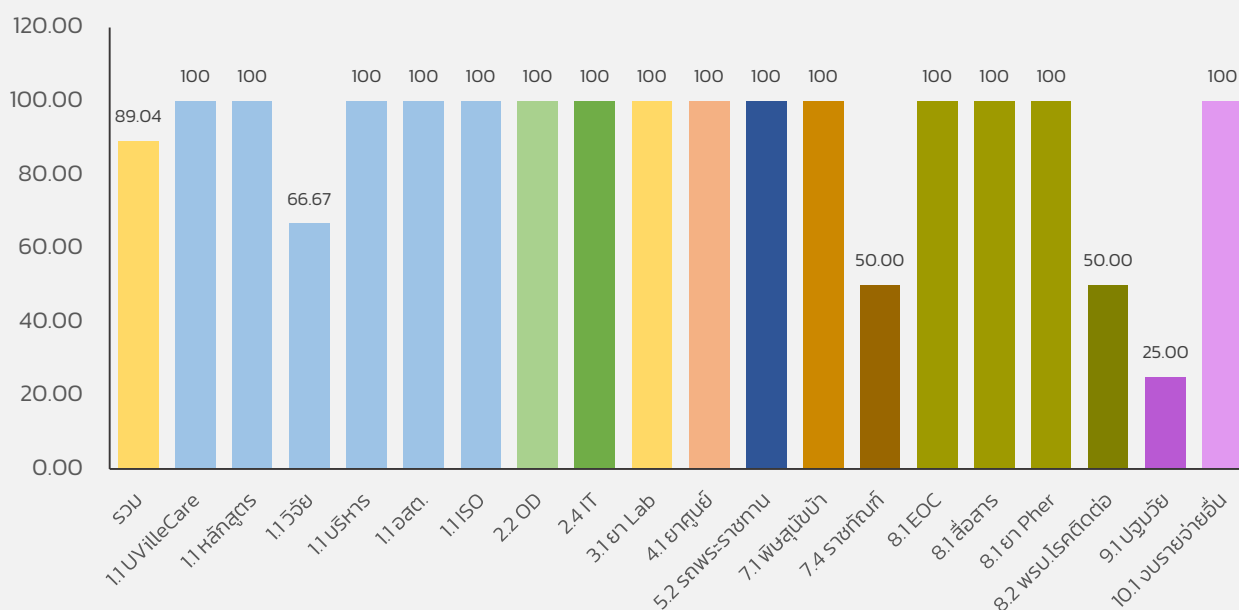


รูปที่ 6 ร้อยละความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ครอบคลุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
1	1.1	โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้านการป้องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยในพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า	1.รูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยในพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า	1 รูปแบบ	2 รูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยในพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า คือ ในหมู่บ้านจัดสรร และในชุมชนแออัด		100
			2.กลไกการจัดการโรคและภัยสุขภาพในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองในหมู่บ้านจัดสรร และชุมชนแออัด (Health Enhancing Zone: HEZ)	1 เรื่อง	กลไกการจัดการโรคและภัยสุขภาพในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมือง 2 เรื่องคือ ในหมู่บ้านจัดสรร 234 แห่ง และชุมชนแออัด (Health Enhancing Zone: HEZ) 2 แห่ง		
			3.ชุดข้อมูลด้านสุขภาพ (Data platform)	1 เรื่อง	ชุดข้อมูลสุขภาพ (Data platform) ชื่อ สคปม. UVILLCARE PLUS ผ่าน http://uvc.iudcthailand.org/home/		

หมายเหตุ



หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)

หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)

หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ครอบคลุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
2	1.1	โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสาธารณสุข	1.หลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	1 หลักสูตร/ 12 รายวิชา	หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง มีด้วยกันทั้งสิ้น 11 รายวิชา		100
			2.บุคลากรที่ได้เข้ารับการพัฒนาศักยภาพด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง	50 คน	พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำประมวลรายวิชา 50 คน		

หมายเหตุ

	หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)
	หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)
	หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
3	1.1	โครงการพัฒนา งานวิจัยและนวัตกรรม สถาบันป้องกันควบคุม โรคเขตเมือง	1.ผลงานวิชาการและวิจัย นวัตกรรม	2 เรื่อง	ผลงานวิชาการ และวิจัย นวัตกรรม 5 เรื่อง ได้แก่ 1.COVID-19 Transmission among Healthcare Workers at a Quarantine Facility in Thailand: Genomic and Outbreak Investigations (Kamontip Asawawaranan, 2021) 2.Setting up COVID-19 laboratory during the pandemic: experience from Bangkok (Kamontip Asawawaranan, 2021) 3.Case Report of Skin Lesions in COVID-19 Patient in A Private Hospital, Thailand in April 2020 (Nathan Kunlaphattharawet, 2021) 4.Survey of Corona Virus diseases 2019 (COVID-19) prevention behavior amongclients in dermatology clinic, Institute for Urban Disease Control and Prevention (Orawan Wongsathit & Somkhanae Amsuriya, 2021) 5.The Behavior and Readiness for Responding to COVID-19 among migrant workers in Urban Areas, Bangkok, Thailand (Nattama Rongmalee, Khammakorn Thiangthangthum, Pormporn Jampathong, Saksont Jittimane & Warongkoch Chettaphun, 2021)		66.67
			2.พัฒนานักวิจัยและวิชาการ	20 คน	-		
			3.วารสารวิชาการ สปคม.	2 ฉบับ	วารสารวิชาการ สปคม. ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มี 2 ฉบับ ได้แก่ - ฉบับที่ 1 กันยายน 2563 - กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564 - ฉบับที่ 2 มีนาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2564		

หมายเหตุ

หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)

หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)

หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
4	1.1	โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2564	1.การบริหารจัดการองค์กร 1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ร้อยละ 98 1.2 ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ร้อยละ 95 1.3 ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาในแผนงานโครงการที่กำหนด ร้อยละ 95	1 หน่วยงาน	บริหารจัดการองค์กรเรียบร้อย 1 หน่วยงาน โดยมีรายละเอียดการบริหารจัดการองค์กรดังนี้ 1.1 ร้อยละของการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงาน ร้อยละ 99.94 1.2 ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามแผน ร้อยละ 100 1.3 ร้อยละของกิจกรรมที่ดำเนินการแล้วเสร็จตามเวลาในแผนงานโครงการที่กำหนด ร้อยละ 100		100
5	1.1	โครงการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขสุบต่างด้าว (อสต.) พื้นที่กรุงเทพมหานคร	1.เครือข่ายแรงงานต่างด้าวได้รับการสนับสนุนการจัดกระบวนการอบรมพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 2.เครือข่ายแรงงานต่างด้าวได้รับการสนับสนุนการจัดกระบวนการอบรมพัฒนาศักยภาพ และองค์ความรู้ป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ 3.รายงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขสุบต่างด้าวพื้นที่กรุงเทพมหานคร	1 หลักสูตร 2 เขต 1 เรื่อง	หลักสูตรการอบรมเครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขสุบต่างด้าว ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และเขตบางแค เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุขสุบต่างด้าว ในพื้นที่เขตบางขุนเทียน และเขตบางแค รายงานการพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขสุบต่างด้าวพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1 เรื่อง		100

หมายเหตุ

หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)

หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)

หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโรงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
6	1.1	โครงการการพัฒนาคุณภาพห้องปฏิบัติการอ้างอิงทางการแพทย์สู่ระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการ ตามข้อกำหนดด้านวิชาการและด้านบริหารจัดการมาตรฐานสากล ISO15189 และ ISO15190	1.รายงานฉบับสมบูรณ์ประกอบด้วยรายชื่อเอกสารคุณภาพ คู่มือคุณภาพ เอกสารมาตรฐานวิธี แบบฟอร์มต่างๆ ที่ได้ดำเนินการจนพร้อมยื่นขอการรับรอง	1 เรื่อง	รายงานฉบับสมบูรณ์ 2 เรื่อง 1.รายงานผลการประเมิน Internal Audit และ Corrective Action Request 2.รายงานผลการเตรียมความพร้อมในการประเมินมาตรฐาน ISO15189 และ ISO15190		100
7	2.2	โครงการพัฒนาองค์กรและพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 4.0	1.สปคม. มีระบบบริหารจัดการภาครัฐตามเกณฑ์ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ในระดับก้าวหน้า	1 หน่วยงาน	ระบบบริหารจัดการภาครัฐ ตามเกณฑ์ระบบราชการ 4.0 (PMQA 4.0) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สปคม.ได้ในระดับก้าวหน้า		100
			2.บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมือง	100 คน	บุคลากรได้รับการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคในเขตเมืองจำนวน 189 คน		

หมายเหตุ

หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)

หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)

หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ครอบคลุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
8	2.4	โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลโรคและภัยสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่เขตเมืองของประเทศปีงบประมาณ 2564	1.หน่วยงานมีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพประชากรเขตเมือง	1 หน่วยงาน	สปคม.มีศูนย์ข้อมูลสารสนเทศสุขภาพประชากรเขตเมือง		100
			1.หน่วยงานมีระบบสารสนเทศการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคและภัยสุขภาพในเขตเมือง	3 ระบบ	สปคม. มีระบบสารสนเทศ 3 ระบบ ดังนี้ 1.ฐานข้อมูลโรคติดต่อเขตเมือง 2.ระบบรายงานข้อมูล/เฝ้าระวัง โรคโควิด-19 Co-link 3.ระบบการนัดหมายเข้ารับบริการ Vaccine Passport		
9	3.1	โครงการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดที่เป็นปัญหาในเขตเมือง พ.ศ. 2564 (จัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์)	1.จำนวนผู้ป่วยที่ได้รับการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดตามฤดูกาล	3,000 ราย	จำนวนการตรวจวิเคราะห์หาสารพันธุกรรม SARS-CoV-2 168,018 ตัวอย่าง		100
			2.จำนวนการตรวจวินิจฉัยงานด้านภูมิคุ้มกัน	3,000 ราย	จำนวนการตรวจหาภูมิคุ้มกัน 11,340 ราย		
			3.รายงานการตรวจวินิจฉัยโรคระบาดที่เป็นปัญหาในเขตเมือง	1 เรื่อง	รายงานผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการ ปี 2564		

หมายเหตุ

	หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)
	หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)
	หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ครอบคลุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
10	4.1	โครงการสนับสนุนค้นหาและคัดกรองโรคเรื้อนและสนับสนุนการรักษาและควบคุมโรค การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมและภัยสุขภาพ ปีงบประมาณ 2564 (จัดซื้อยาและเวชภัณฑ์มีใช้ฯ)	1.จำนวนผู้ได้รับการค้นหา คัดกรองโรคเรื้อน โรคที่เกิดร่วม และเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายในกลุ่มนักท่องเที่ยว นักเดินทาง	15,000 ราย	จำนวนผู้ได้รับการค้นหา คัดกรองโรคเรื้อน โรคที่เกิดร่วม และเฝ้าระวังโรคติดต่ออันตรายในกลุ่มนักท่องเที่ยว นักเดินทาง 44,818 ราย		100
11	5.2	โครงการการตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวโมเลกุล ในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย	1.จำนวนผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	50,000 ราย	ผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 867,095 ราย		100
			2.จำนวนเครือข่ายจิตอาสาป้องกัน COVID-2019 ในพื้นที่เขตเมือง	10 แห่ง	จำนวนเครือข่ายจิตอาสาป้องกัน COVID-2019 ในพื้นที่เขตเมือง 370 คน (เครือข่ายอาสาสมัครสาธารณสุข ควบคุมโรค)		
			3.รายงานผลการดำเนินงานรับมือกับการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกสอง	1 เรื่อง	รายงานตามรอยรถพระราชทาน ให้บริการปวงชนชาวไทยตรวจโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง		

หมายเหตุ

หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)

หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)

หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ครอบคลุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
12	7.1	โครงการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ร.สเมด็จเจ้าฟ้าฯกรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี	1.การจัดการข้อมูลเฝ้าระวังโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	1 เรื่อง	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุข/สำนักงานเขตของพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมบูรณาการ/รณรงค์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า ได้แก่ 1. ไร้อุปประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2. รณรงค์นำสัตว์เลี้ยงมารับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 3. พัดพลาสติกประชาสัมพันธ์การป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า		100
			2.จำนวน อสส.และภาคีเครือข่าย ที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ในการดำเนินการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า	100 ราย	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ไม่สามารถจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสส. และภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า โดยได้ดำเนินการปรับแผน ให้ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์การป้องกันควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า แจก อสส.และภาคีเครือข่าย จำนวน 1,300 ราย		

หมายเหตุ

หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)

หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)

หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
13	7.4	โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเรือนจำ ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์	1.รูปแบบการเข้าถึงการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญในเรือนจำ	1 เรื่อง	รูปแบบการคัดกรอง HIV ในกลุ่มผู้ต้องขังในเรือนจำ		50
			2.เครือข่ายราชทัณฑ์ปันสุขได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงาน	4 แห่ง	เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสองตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 ทัณฑสถานมีนโยบายปิดเรือนจำ ทำให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองไม่สามารถเข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินงาน รวมถึงมาตรการลดการประชุม การรวมตัว หรือจัดนิทรรศการเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อ จึงงดการจัดสัมมนา แล้วดำเนินการปรับแผนแทน		


หมายเหตุ

	หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)
	หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)
	หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ครอบคลุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
14	8.1	โครงการเตรียมความพร้อมการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ระลอกสอง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่เขตเมือง	1.หน่วยงานมีระบบและการเตรียมความพร้อมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่เขตเมือง	1 หน่วยงาน	หน่วยงานมีระบบและการเตรียมความพร้อมการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่เขตเมือง โดยจัดตั้งคณะทำงาน EOC ขึ้น		100
			2.ประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่เขตเมืองได้รับการคัดกรองเพื่อเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค	30,000 ราย	ผู้รับบริการตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จำนวน 867,095 ราย		
			3.เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการสนับสนุน การเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์โรคในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	13 หน่วยงาน	เครือข่ายหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้รับการสนับสนุน การเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์โรคในภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 70 หน่วยงาน		
			4.สรุปบทเรียนระบบการจัดการและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในบริบทเมืองประเทศไทย	1 เรื่อง	ดำเนินงานถอดบทเรียนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตเมือง ประเด็นเรื่องการดำเนินงานโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในระลอกที่ 1 ของสถานพยาบาลในพื้นที่กรุงเทพมหานคร เพื่อนำมาปรับปรุงแนวทางและแผนการดำเนินงานการปฏิบัติงานในการรับมือในการระบาดในระลอกที่ 2		

หมายเหตุ



หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)

หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)

หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ครอบคลุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
15	8.1	โครงการสื่อสารความเสี่ยงและผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตเมือง ปี 2564	1.สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหน่วยงานเครือข่ายเป้าหมายเขตเมือง	3 เรื่อง	สนับสนุนสื่อประชาสัมพันธ์ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในหน่วยงานเครือข่ายเป้าหมายเขตเมือง 3 เรื่อง ดังนี้ 1.1 การป้องกันโควิด 19 สำหรับ อาสาสมัครต่างด้าว สปคม. (เลื้อสต.) 1.2 สื่อประชาสัมพันธ์ ชุด การป้องกันควบคุมโรคโควิด 19 และอื่น ๆ ในโรงเรียน สถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (โรลอัพ) 1.3 สื่อประชาสัมพันธ์ ชุด ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า (โรลอัพ)		100


หมายเหตุ

	หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)
	หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)
	หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการฯ กรมควบคุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
			2.ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตเมือง	10 ครั้ง	ผลิตสื่อประชาสัมพันธ์สื่อสารความเสี่ยงป้องกันควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตเมือง 10 ครั้ง ดังนี้ 1. สื่อประชาสัมพันธ์ (สื่อ) การป้องกันโควิด 19 สำหรับอาสาสมัครต่างด้าว สปคม. 2. โรลอัพ เรื่อง การป้องกันควบคุมโควิด 19 ในโรงเรียนสถานศึกษา และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3. โรลอัพ เรื่อง 10 มาตรการประจำวันป้องกันโควิด 19 ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 4. โรลอัพ เรื่อง โรคติดเชื้อทางเดินหายใจจากเชื้อไวรัสอาร์เอสวี 5. โรลอัพ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคไข้หวัดใหญ่สำหรับสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 6. โรลอัพ เรื่อง การป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากสำหรับสถานศึกษาและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 7. โรลอัพ เรื่อง แนวทางการคัดกรองและดูแลเด็กป่วยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กและโรงเรียนอนุบาล 8. โรลอัพ เรื่อง ความรู้เรื่องโรคพิษสุนัขบ้า 9. โรลอัพ เรื่อง การป้องกันสัตว์เลี้ยงจากโรคพิษสุนัขบ้า 10. สื่อประชาสัมพันธ์ (พด) เรื่อง ถูกสุนัข แมว กัด บ่วน เลี้ยงพล ต้องปฏิบัติอย่างไร		
			3.กิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเมือง	48 แห่ง	กิจกรรมสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์การปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในเขตเมือง 48 แห่ง		

หมายเหตุ



หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)
หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)
หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ครอบคลุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
16	8.1	โครงการเตรียมความพร้อมด้านเวชภัณฑ์ในการตอบโต้ภาวะฉุกเฉินในเขตเมืองปีงบประมาณ 2564 (จัดซื้อยาฯ และวัสดุวิทยาศาสตร์)	1.จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์	1 งาน	จัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มีใช้ยา และวัสดุวิทยาศาสตร์ เรียบร้อย		100
			2.จำนวนผู้ได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน การสอบสวน การควบคุมโรค และการสนับสนุนทางห้องปฏิบัติการ	10,000 ราย	ผู้ได้รับบริการเฝ้าระวัง ป้องกัน การสอบสวน การควบคุมโรค และการสนับสนุนทางห้องปฏิบัติการจำนวน 112,298 ราย		
17	8.2	โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558	หน่วยงานเครือข่ายมีการนำ พรบ. โรคติดต่อ 2558 ไปใช้ในการดำเนินงาน เฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ	1 หน่วยงาน	จัดอบรมพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติการควบคุมโรค รุ่นที่ 1 โดยมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานเข้าร่วม ดังนี้. เจ้าหน้าที่สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง2. เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลทุกสังกัดในกรุงเทพมหานคร3. เจ้าหน้าที่ศูนย์บริการสาธารณสุขซึ่งการอบรมมีการอธิบายเกี่ยวกับพรบ. โรคติดต่อ 2558 แต่ไม่สามารถประเมินผลว่าหน่วยงานเครือข่ายมีการนำ พรบ. โรคติดต่อ 2558 ไปใช้ในการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ		50
18	9.1	โครงการพัฒนาและสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย	1.ข้อมูลเฝ้าระวังสุขภาพเด็กในสถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานสงเคราะห์เด็กพื้นที่กรุงเทพมหานคร	1 เรื่อง	ดำเนินการประสานความร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเยี่ยมเสริมพลัง และศึกษาดูงาน ส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่ กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน และได้สนับสนุนเวชภัณฑ์จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง		25

หมายเหตุ

หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)

หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)

หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

ตารางที่ 5 ตารางบันทึกผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ด้านผลผลิตของโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการ ครอบคลุมโรค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

ลำดับ	กิจกรรมหลักที่	ชื่อโครงการ	ผลผลิตโครงการ	จำนวน	ผลสัมฤทธิ์	ผลการประเมิน	ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการ
			2.เครือข่ายสถานรับเลี้ยงเด็ก/สถานสงเคราะห์เด็กได้รับการพัฒนาศักยภาพด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อกลุ่มเด็กปฐมวัย	270 เครือข่าย	ปรับเปลี่ยนแผนพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อ กลุ่มเด็กปฐมวัย ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ระบาดของ Covid-19 โดยโอนงบประมาณคืนให้หน่วยงานบริหารจัดการ		
19	10.1	โครงการเตรียมความพร้อมรับมือต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตราย ปี 2564	1.แผนเตรียมความพร้อมรับมือต่อการระบาดของโรคไข้หวัดใหญ่ โรคติดต่ออุบัติใหม่ และโรคติดต่ออันตราย	1 เรื่อง	ได้จัดทำแผนเตรียมความพร้อมรับมือต่อการระบาดฯ จากการจัดประชุมคณะกรรมการเตรียมวางแผนฯ เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2563		100
			2.รายงานผลการประเมินความรู้โรคติดต่อสำหรับแรงงานต่างด้าว 2 สัญชาติ(เมียนมาและกัมพูชา)	1 เรื่อง	จัดทำรายงานประเมินผลความรู้โรคติดต่อสำหรับแรงงานต่างด้าว 2 สัญชาติ จากผู้ตอบแบบสอบถาม ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 333 ราย ผลการประเมินความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) พบว่าส่วนใหญ่มีความรู้ระดับดี		
รวม							89.04

หมายเหตุ

หมายถึง ดำเนินการแล้วเสร็จ (ร้อยละ 100)

หมายถึง ดำเนินการแต่ยังไม่บรรลุผลผลิตที่คาดหวัง (ร้อยละ 50)

หมายถึง ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากสถานการณ์ Covid-19c (ร้อยละ 0)

4.3 ผลดำเนินงานโครงการตามจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2563 – 2564 (4 เสาหลัก)

การดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จากแผนงานโครงการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 มีโครงการที่สอดคล้องกับจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2563 – 2564 (4 เสาหลัก) และงานสนับสนุนด้านบริหารทรัพยากร และพัฒนาองค์กร (ฐาน) ที่ทำให้การบริหารจัดการ และการดำเนินงานตาม 4 เสาหลักเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อธิบายดังรูปที่ 7 และมีรายละเอียดดังนี้



รูปที่ 7 จุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ. 2563 – 2564 (4 เสาหลัก) และงานสนับสนุน (ฐาน) ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินโครงการ

4.3.1 ลดความเหลื่อมล้ำ ยกระดับการดูแลใน “พื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า” (Health Enhancing Zone: HEZ)

เสาหลักที่ 1 จะช่วยยกระดับ (Leverage) ระบบการดูแลสุขภาพของพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า ได้แก่ ชุมชนแออัด บ้านจัดสรรคอนโดมิเนียม ชุมชนการเคหะ ซึ่งมีโครงการที่สอดคล้องกับเสาหลักนี้ คือ

➤ โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้านการป้องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยในพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า

ผลการดำเนินงานของโครงการที่ดำเนินงานภายใต้เสาหลักนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- ประชุมราชการ เพื่อชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการพัฒนารูปแบบและกลไกป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วม สำหรับหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตเมือง ปี 2564 (uVilleCare) ทั้งยังแจ้งคำสั่งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองที่ 132/2563 ลงวันที่ 28 กันยายน 2563 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานโครงการพัฒนารูปแบบกลไกการป้องกันโรค ควบคุมโรค และภัยสุขภาพ อย่างมีส่วนร่วมสำหรับหมู่บ้านจัดสรรในพื้นที่เขตเมือง เพื่อให้คณะทำงานทราบถึงบทบาท หน้าที่การปฏิบัติงาน และให้มีการแจ้งเวียนให้กลุ่มอื่นๆ ทราบ โดยในที่ประชุมมีการชี้แจงวัตถุประสงค์ของโครงการฯ ชี้แจงแผนการดำเนินงาน และชี้แจงแผนการใช้งบประมาณ งบประมาณจัดการโครงการเพื่อจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณตอบแทนใช้จ้างลูกจ้างโครงการ

- ประชุมเชิงปฏิบัติการ เป็นการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเขตเมือง โดยนำเครือข่ายเขตเมือง จังหวัดนครราชสีมา มานำเสนอผลสำเร็จของโครงการในพื้นที่ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์บทเรียนรู้การทำงานป้องกันควบคุมโรคร่วมกับเครือข่ายเขตเมืองทั่วประเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพเครือข่ายในการพัฒนารูปแบบการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรค และภัยสุขภาพของประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร และทราบทิศทางการดำเนินงาน ตัวชี้วัดจุดเน้นงานพัฒนาระบบกลไกการจัดการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ปี 2564 และจัดทำแนวทางให้สอดคล้องกับตัวชี้วัดจุดเน้นและนโยบายพัฒนาระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิ เพื่อให้เกิดการป้องกันควบคุมโรคในพื้นที่เขตเมืองทั่วประเทศ ที่มีรูปแบบหลากหลาย เกิดนวัตกรรมจัดการ และมีการเรียนรู้ร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เสริมความเข้มแข็งระบบบริการสุขภาพปฐมภูมิในเขตเมืองต่อไป

- ชี้แจงแนวทางการดำเนินงานโครงการ uVilleCare และเยี่ยมเสริมพลังเครือข่าย พื้นที่ สคร.ที่ 3 นครสวรรค์ สคร. 7 ขอนแก่น สคร. 12 สงขลา สคร. 1 เชียงใหม่ วัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอข้อมูลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร จำนวน 8 หมู่บ้าน ในพื้นที่ 8 จังหวัด เพื่อนำมาวิเคราะห์หาปัญหาในหมู่บ้าน

- คืบข้อมูลสุขภาพประชาชนในหมู่บ้านจัดสรร อำเภอเมืองนครราชสีมา ผลการสำรวจข้อมูลสุขภาพประชาชน จำนวน 12,155 คน ใน 234 หมู่บ้าน

4.3.2 พัฒนาระบบสุขภาพเขตเมือง

เสาหลักที่ 2 จะช่วยพัฒนาด้าน Digital Platform เพื่อการเฝ้าระวังและแลกเปลี่ยนข้อมูลกับเครือข่ายการจัดการระบบข้อมูลสุขภาพด้วย Technology Enabled Care: TEC Digital Health Literacy ซึ่งมีโครงการที่สอดคล้องกับเสาหลักนี้แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ

➤ โครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

โครงการที่สอดคล้องกับกลุ่มนี้มีด้วยกัน 3 โครงการ คือ

- 1) โครงการสื่อสารความเสี่ยง และผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ เพื่อปฏิบัติการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตเมือง ปี 2564
- 2) โครงการเตรียมความพร้อมการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ระลอกสอง และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่เขตเมือง
- 3) โครงการตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย

ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ทั้ง 3 โครงการ มีผลการดำเนินงานดังนี้

- จัดตั้งทีมคณะกรรมการตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกโดยรถตรวจโรคติดเชื้อชีวนิรภัย ในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ทีม เพื่อกระจายลงพื้นที่ในหลายพื้นที่
- ดำเนินการกำจัดซื้อจัดจ้างพนักงานขับรถตรวจเชื้อชีวนิรภัยพระราชทาน และรถตรวจวิเคราะห์ผลด่วนพิเศษ
- ออกปฏิบัติงานตรวจคัดกรองโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยรถตรวจเชื้อชีวนิรภัย จัดบริการตรวจค้นหาเชิงรุกในพื้นที่ จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดยะลา และพื้นที่กรุงเทพมหานคร อาทิ สนามกีฬาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย สนามกีฬาราชวังมณฑล สโมสรทหารบก วิทยาลัยรังสิต
- ประชุมและแต่งตั้งคณะกรรมการศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข (EOC) ครั้งที่ 1 เสร็จสิ้น



- ดำเนินการวางแผนจัดเตรียมประชุมคณะทำงานศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุข ครั้งที่ 2 ซึ่งมีการปรับคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน ตามคำสั่งสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่ 224/ 2563 ทั้งนี้ มีการประชุมกลุ่มย่อยเพื่อวางแผนและแลกเปลี่ยนแนวทางการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรองรับการป้องกันการระบาดของโคโรนาไวรัส 2019 ระลอกสองและสาม และการจัดการภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขในพื้นที่เขตเมือง

- ดำเนินการเก็บตัวอย่างการในสถานกักกันโรคแห่งรัฐ ระหว่างเดือน ตุลาคม – มิถุนายน พ.ศ. 2563

- ดำเนินการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกในพื้นที่เสี่ยงสูง และกลุ่มผู้สัมผัสเสี่ยงสูง จากการสอบสวนโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 และสนับสนุนการค้นหาผู้ป่วยเชิงรุกให้กับเครือข่ายในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และพื้นที่ใกล้เคียง ยอดสะสมการให้บริการตรวจคัดกรองเชิงรุกตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2563 – 31 พฤษภาคม พ.ศ.2564 จำนวนรวม 464,511 ราย

- ดำเนินการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายการสอบสวนและป้องกันควบคุมโรค (CDCU) และถอดบทเรียนการตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในพื้นที่เขตเมือง ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564

- จัดทำแผนสื่อสารความเสี่ยงและประชาสัมพันธ์โรคและภัยสุขภาพ สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ 2564 ซึ่งกำหนดให้มี 12 เรื่อง โดยกลุ่มเป้าหมายคือ ประชาชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร



โครงการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อ

โครงการที่สอดคล้องกับกลุ่มนี้มีด้วยกัน 3 โครงการ คือ

1) โครงการบูรณาการความร่วมมือเพื่อขับเคลื่อนงานเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดต่อสำคัญในเรือนจำ ภายใต้แผนปฏิบัติการโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ทำความ ดี เพื่อชาติ ศาสน์ กษัตริย์

2) โครงการพัฒนา และสนับสนุนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคติดต่อในเด็กปฐมวัย

3) โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ. 2558



ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมโรคติดต่อทั้ง 3 โครงการนี้ มีผลการดำเนินงานดังนี้

- มีการประชุมวางแผนภายในกลุ่มผู้จัดในการจัดประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคที่สำคัญในเรือนจำ และได้ติดต่อไปยังผู้ประสานโครงการราชทัณฑ์ปันสุขของกองโรคเอดส์และโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์

- ลงพื้นที่เพื่อสนับสนุนการเข้าถึงการเฝ้าระวังโรคที่สำคัญในเรือนจำ 8 แห่ง

- เนื่องจากสถานการณ์การระบาดของโรคโควิด-19 ระลอกสองตั้งแต่ปลายเดือนธันวาคม 2563 และระลอกที่ 3 ปลายเดือนเมษายน 2564 ที่มีการระบาดของโรคโควิด-19 เป็นวงกว้าง อีกทั้งยังมีการระบาดในพื้นที่กักขังสถาน ส่งผลให้กักขังสถานมีนโยบายปิดเรือนจำ ทำให้สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองไม่สามารถเข้าร่วมสนับสนุนการดำเนินงานได้ตามแผนการดำเนินงาน รวมถึงมาตรการลดการประชุม การรวมตัว หรือจัดนิทรรศการเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื่อ จึงงดกิจกรรมนิทรรศการราชทัณฑ์ปันสุข เป็นการสรุปและถอดบทเรียนแทนกิจกรรมดังกล่าว

- ดำเนินงานในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชนกรมกิจการเด็กและเยาวชน เขตราชเทวี กรุงเทพมหานครวันที่ 25 มีนาคม 2564

- ประสานความร่วมมือกับเครือข่ายกลุ่มส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัย โดยเยี่ยมเสริมพลัง และศึกษาดูงานส่งเสริมการพัฒนาเด็กปฐมวัยในสถานรับเลี้ยงเด็กเอกชน ที่กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน และได้สนับสนุนเวชภัณฑ์จากสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นสำหรับการป้องกันควบคุมโควิด-19 ในสถานรับเลี้ยงเด็ก

- ดำเนินการอบรม พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่เพื่อปฏิบัติงานเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมโรคในสถานที่กักกันซึ่งทางราชการกำหนด (Quarantine Facilities) ระหว่างวันที่ 15 – 19 มีนาคม 2564



โครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า

โครงการที่สอดคล้องกับกลุ่มนี้มีด้วยกัน 1 โครงการ คือ

1) โครงการผลักดันการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าภายใต้ยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานของศาสตราจารย์ร.สเมด็จเจ้าฟ้าฯ กรมพระศรีสวางควัฒนวรขัตติยราชนารี

ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับโรคพิษสุนัขบ้า มีผลการดำเนินงานดังนี้

- วางแผนการดำเนินงานสัมมนาวิชาการ เรื่องการจัดการข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสนับสนุนการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเดือน ธันวาคม 2563 ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- ประสานผู้บริหารของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินงานโรคพิษสุนัขบ้าและสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตรอยต่อรอบเขตกรุงเทพมหานคร เพื่อการบริหารจัดการ/การวางแผนสั่งการให้เกิดการดำเนินงานพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
- ดำเนินการประสานและเดินทางเข้าร่วมการประชุมย่อยเพื่อปรึกษาหารือกับสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร กองควบคุมโรคติดต่อ และสำนักสัตวแพทยของกรุงเทพมหานคร
- ดำเนินการวางแผนการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพ อสส. และภาคีเครือข่าย ในการดำเนินงานสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเดือน มกราคม 2564 ให้ได้ตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้
- ผลิตสื่อโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยบริการสาธารณสุขหรือสำนักงานเขตของพื้นที่กรุงเทพฯ ร่วมบูรณาการ/รณรงค์การสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า เป็นโรลอัป และ คู่มือการสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า
- ประสานงาน และจัดประชุมย่อยกับผู้บริหารของสำนักอนามัยกรุงเทพมหานคร ได้แก่ ผู้อำนวยการกองควบคุมโรคติดต่อ ผู้อำนวยการสำนักงานสัตวแพทยกรุงเทพมหานคร และปศุสัตว์กรุงเทพมหานคร เพื่อสร้างพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าในเขตรอยต่อรอบกรุงเทพมหานคร ในปีงบประมาณ 2564
- ประสานงานผู้รับผิดชอบโรคพิษสุนัขบ้าของกองโรคติดต่อทั่วไป กรมควบคุมโรค เพื่อปรึกษาหาแนวทางการปฏิบัติงานต่อไป

- กำหนดปฏิบัติงานประสานงานสำนักงานเขตที่เป็นพื้นที่เสี่ยง และพื้นที่เฝ้าระวัง จำนวน 6 เขต เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานและประเมินความพร้อมในการสร้างพื้นที่ปลอดภัยพิชิตภัย ได้แก่ สำนักงานเขตลาดกระบัง เขตประเวศ เขตทุ่งครุ เขตคันนายาว เขตหนองจอก และเขตคลองสามวา

- ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เขตที่เป็นพื้นที่เฝ้าระวัง จำนวน 2 พื้นที่ และพื้นที่ที่มีความเสี่ยง จำนวน 2 พื้นที่ รวม 4 พื้นที่ และดำเนินการส่งแบบประเมินพื้นที่ปลอดภัยพิชิตภัยให้สำนักงานเขตที่คัดเลือก ประเมินตนเอง เพื่อเตรียมความพร้อมของบริบทพื้นที่

โครงการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล

โครงการที่สอดคล้องกับการกลุ่มนี้มีด้วยกัน 3 โครงการ คือ

1) โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลโรค และภัยสุขภาพที่สำคัญในพื้นที่เขตเมืองของประเทศไทยปีงบประมาณ 2564

2) โครงการลดความเหลื่อมล้ำด้านการป้องกันควบคุมโรคในลักษณะประชากรเฉพาะเขตเมืองของผู้พักอาศัยในพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลสุขภาพของประชาชนในรูปแบบ Electronic Personal Health Record (e-PHR)

3) การตรวจคัดกรองค้นหาเชิงรุกโดยรถตรวจโรคติดต่อเชื้อซoonิรภัย ในพื้นที่เสี่ยงของประเทศไทย มุ่งเน้นการพัฒนาระบบการลงทะเบียนเข้ารับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 ออนไลน์ และการเชื่อมโยง Plat Form ระบบข้อมูลระหว่างรถตรวจซoonิรภัย และห้องปฏิบัติการทางด้านการแพทย์

ซึ่งโครงการที่เกี่ยวข้องกับศูนย์ข้อมูล มีผลการดำเนินงานดังนี้

- จ้างเหมา พัฒนาและปรับปรุงฐานข้อมูลโรคติดต่อเขตเมืองกรุงเทพมหานคร เรียบร้อยพร้อมส่งมอบ 7 กันยายน 2564 มีแก้ไขเพิ่มเติมบางส่วน สามารถเข้าใช้งานได้เต็มรูปแบบ ตุลาคม 2564

- พัฒนาระบบการรายงาน/เฝ้าระวังโรคโควิด 19 ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ระบบรายงาน CO Link



- อยู่ระหว่างดำเนินการพัฒนาการเชื่อมต่อบริบบข้อมูลสุขภาพของผู้พักอาศัยในหมู่บ้านจัดสรร

- พัฒนาระบบการแจ้งผลการตรวจทางห้องปฏิบัติการเพื่อตรวจยืนยัน COVID-19 ผ่านระบบ SMS และเปิดให้ประชาชนสามารถดาวน์โหลดผลการตรวจผ่านระบบออนไลน์

4.3.3 เพิ่มศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคให้กับ อปท.

เสาหลักที่ 3 จะช่วยสร้างผู้เชี่ยวชาญในการจัดการป้องกันควบคุมโรคในเขตเทศบาลนคร เทศบาลเมือง ซึ่งมีโครงการที่สอดคล้องกับเสาหลักนี้คือ

➤ โครงการพัฒนาศักยภาพการป้องกันควบคุมโรคให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสาธารณสุข

ผลการดำเนินงานของโครงการที่ดำเนินงานภายใต้เสาหลักนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- มีการจัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ครั้งที่ 3 และ 4 เพื่อติดตามความก้าวหน้าของการดำเนินงานพัฒนาหลักสูตรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ผลลัพธ์ของงานที่ได้คือ รายงานความก้าวหน้าของการจัดทำโครงการพัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 10 ปี

- มีการจัดตั้งศูนย์อบรมและวิจัยด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

- รายงานความก้าวหน้าของการจัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมกันระหว่างกรมควบคุมโรค และมหาวิทยาลัย รวมทั้งจัดทำข้อตกลงความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานในขั้นตอนต่อไป

- จัดทำฐานข้อมูลผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

- ประชุมพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการจัดทำประมวลรายวิชา จำนวน 5 ครั้ง

- ดำเนินการปรับปรุงอาคารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 3 ชั้น เพื่อเป็นสถานที่ในการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต การป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

4.3.4 วิจัยพัฒนารูปแบบการควบคุมโรคเขตเมือง

เสาหลักนี้จะช่วยพัฒนาสมรรถนะการในการขับเคลื่อน Medical Fitness to Drive Model พัฒนารูปแบบการสอบสวนโรคในพื้นที่สุขภาพมุ่งเป้า (HEZ) พัฒนากลไกการเงินการคลังของท้องถิ่นให้เอื้อต่อการป้องกันควบคุมโรค และจัดการระบบข้อมูลอุบัติเหตุการณ์การจราจร ซึ่งมีโครงการที่สอดคล้องกับเสาหลักนี้ คือ

➤ โครงการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง

ผลการดำเนินงานของโครงการที่ดำเนินงานภายใต้เสาหลักนี้ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

- จัดตั้งคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ ปีพ.ศ. 2564
- สำรวจข้อมูลองค์ความรู้ความเชี่ยวชาญในสาขาการวิจัย รวมทั้งประชาสัมพันธ์ให้เจ้าหน้าที่สายวิชาการ หรือสายสนับสนุนเข้าระบบการเรียนรู้ออนไลน์หลักสูตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- จัดประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ นวัตกรรมและเทคโนโลยี ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพ
- ดำเนินการตีพิมพ์วารสารสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง จำนวน 2 ฉบับ ฉบับที่ 5 เดือน กันยายน 2563 – เดือนกุมภาพันธ์ 2564 และฉบับที่ 6 เดือน มีนาคม – สิงหาคม 2564 มีบุคลากรสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองร่วมส่งบทความในการตีพิมพ์ จำนวน 5 เรื่อง

4.3.5 งานสนับสนุนด้านบริหารทรัพยากร และพัฒนาองค์กร

งานสนับสนุนด้านบริหารทรัพยากร และพัฒนาองค์กร งานนี้จะเป็นฐานที่คอยช่วยสนับสนุนให้การดำเนินงานภายใต้ 4 เสาเป็นไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งมีโครงการที่อยู่ภายใต้งานนี้ 2 โครงการ คือ

- 1) โครงการพัฒนาองค์กร และพัฒนากำลังคนด้านการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง 4.0
- 2) โครงการบริหารจัดการทรัพยากร ประจำปีงบประมาณ 2564

ผลการดำเนินงานของโครงการที่ดำเนินงานภายใต้งานสนับสนุนด้านบริหารทรัพยากร และพัฒนาองค์กรมีรายละเอียด ดังต่อไปนี้

- ดำเนินการจัดประชุมพิธีลงนามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ตัวชี้วัดยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัดจุดเน้นการดำเนินงาน และตัวชี้วัดพระราชบัญญัติงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2564 โดยมีการชี้แจงแนวทางการรายงานตัวชี้วัด และแนวทางการติดตามการรายงานผลการดำเนินงาน
- ประชุมราชการเพื่อถ่ายทอดนโยบายการดำเนินงาน ปี 2564 วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 มีบุคลากรสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง เข้าร่วมรับฟังการประชุม มีการชี้แจงนโยบายการดำเนินงาน และติดตามผลการดำเนินงาน และผลการเบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน 100 ราย
- ประชุมประกาศนโยบายการกำกับดูแลองค์กร เพื่อเข้าสู่องค์กรแห่งความรอบรู้ วันที่ 12 มีนาคม 2564
- ส่งบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตร พยาบาล IC และส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมหลักสูตรผู้นำเมือง
- จัดกิจกรรม Star of the Month เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติ และสร้างขวัญกำลังใจแก่บุคลากร โดยใช้เกณฑ์ในการคัดเลือกตามเกณฑ์ I-SMART
- ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านการสื่อสารความเสี่ยง โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ด้วยการสื่อสารภาษาเขียนมาร์พื้นฐาน
- ส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมหลักสูตร อาชีวเวชศาสตร์พื้นฐานสำหรับแพทย์ รุ่นที่ 10 ระหว่างวันที่ 2 สิงหาคม - 30 กันยายน 2564
- ดำเนินการติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินโครงการฯ และการเบิกจ่ายงบประมาณของหน่วยงานเป็นประจำทุกเดือน ผ่านระบบ Zoom Meeting
- การบริหารจัดการทรัพยากร ได้มีการเบิกจ่ายเงินใช้ในเรื่องจัดซื้อ จัดจ้างต่างๆ เช่น ค่าซ่อมบำรุงลิฟต์ ค่าซื้อวัสดุสำนักงาน ค่าน้ำมันเชื้อเพลิง ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ค่าจ้างเหมาดูแลภูมิทัศน์ ค่าจ้างทำความสะอาด ค่าจ้างดูแลรักษาความปลอดภัย และค่าใช้จ่ายประชุม คณะกรรมการบริหาร เป็นต้น





บทที่ 5

บทสรุป



บทที่ 5

บทสรุป

รายงานผลการติดตาม ประเมินการดำเนินงานโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ฉบับนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรวบรวม วิเคราะห์ ประเมินผลการดำเนินโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยวิธีการดำเนินงานผ่านการวางกรอบ และจัดทำเกณฑ์สำหรับการประเมินผลการดำเนินงานโครงการรวบรวมข้อมูลจากเอกสารที่เกี่ยวข้อง ติดตามผลการดำเนินงานตลอดปีงบประมาณ โดยแบบฟอร์มติดตามการปรับแผน และข้อมูลจากระบบ Estimates SM วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล โดยผลการดำเนินงานศึกษารายละเอียดแยกตามรายโครงการ และจุดเน้นการป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง พ.ศ.2563-2564 (4 เสาหลัก) และงานสนับสนุนด้านการบริหารทรัพยากร และพัฒนาองค์กรสรุปผล และจัดทำรายงานเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร และเผยแพร่ผลการดำเนินงานแก่บุคลากรสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง และผู้เกี่ยวข้อง

ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ได้รับอนุมัติให้ดำเนินโครงการ จำนวน 19 โครงการ วงเงินงบประมาณรวม 13,169,601.28 บาท (สิบสามล้านหนึ่งแสนหกหมื่นเก้าพันหกร้อยเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) แบ่งเป็น โครงการที่ได้รับอนุมัติตามกรอบวงเงินประจำปีงบประมาณ จำนวน 16 โครงการ งบประมาณ 12,287,160.00 บาท (สิบสองล้านสองแสนแปดหมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) และโครงการที่ได้รับการอนุมัติระหว่างปีงบประมาณ จำนวน 3 โครงการ โดยทั้ง 3 โครงการได้รับการจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมรวมทั้งสิ้น 882,441.28 บาท (แปดแสนแปดหมื่นสองพันสี่ร้อยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบแปดสตางค์) ซึ่งกิจกรรมที่ถูกระบุไว้ในโครงการมากที่สุดคือ 9 กิจกรรมต่อโครงการ น้อยที่สุดคือ 1 กิจกรรมต่อโครงการ โดยจำนวนโครงการที่มีความนิยมสูงสุดคือ 4 กิจกรรมต่อโครงการ (ร้อยละ 31.58) กิจกรรมประเภทที่ได้รับความนิยมสูงสุด คือ กิจกรรมลงพื้นที่หรือเป็นกิจกรรมที่ลงมือปฏิบัติร้อยละ 24.29 และกิจกรรมที่นิยมน้อยที่สุด คือ กิจกรรมสนับสนุนการดำเนินงาน ร้อยละ 4.29

จากการบริหารโครงการตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ทำให้มีผลการดำเนินงานโครงการฯ ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมืองผ่านไปด้วยดี แต่อาจมีบางโครงการที่ผลการดำเนินงานยังไม่บรรลุผลตามที่ตั้งไว้ เนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาด และบทบาทหน้าที่ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ที่ต้องเข้าไปดำเนินการในการเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสถานการณ์ฉุกเฉิน ทำให้มีการปรับแผนทั้ง 88 ครั้ง โดยส่วนใหญ่รูปแบบในการปรับแผนคือ การปรับงบประมาณระหว่างโครงการ จำนวน 28 ครั้ง เพื่อปรับงบประมาณจากโครงการที่ไม่สามารถดำเนินการได้ไปยังโครงการที่ต้องดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

ผลการดำเนินงานโครงการของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ข้อมูลจากระบบ Estimates SM ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 พบว่า ภาพรวมผลการดำเนินงานโครงการ มีความก้าวหน้า ร้อยละ 91.55 และโครงการส่วนใหญ่สามารถดำเนินการได้ตามเป้าหมาย ร้อยละ 100 คงเหลือโครงการที่ดำเนินการยังไม่ได้ตามเป้าหมายจำนวน 4 โครงการ เมื่อนำผลการดำเนินงานโครงการมารวบรวมข้อมูล วิเคราะห์และประเมินภาพรวมของร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการอยู่ที่ร้อยละ 89.04 โดยมีจำนวน 15 โครงการที่ร้อยละความสำเร็จของผลผลิตโครงการเท่ากับร้อยละ 100 ซึ่งหมายความว่าสามารถดำเนินงานโครงการแล้วได้ผลผลิตตามที่ตั้งไว้อย่างครบถ้วน และคงเหลือโครงการที่ดำเนินการยังไม่ได้ผลผลิตตามเป้าหมายจำนวน 4 โครงการ ซึ่งการดำเนินงานโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 นั้นมีปัญหาอุปสรรคที่ทำให้ผลการดำเนินงานไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ ซึ่งปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการในปีถัดไป มีรายละเอียดดังนี้



5.1 ปัญหาอุปสรรคการดำเนินโครงการ

การดำเนินงานโครงการฯ ของสถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีปัญหาอุปสรรค ดังนี้

1. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอกที่ 2 และ 3 ที่มีการระบาดในวงกว้าง ส่งผลให้การดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ เกิดการหยุดชะงัก เนื่องจากการประกาศงดการจัดกิจกรรมที่เป็นการรวมตัวของคนหมู่มาก และมีความจำเป็นจำเป็นต้องเลื่อนการดำเนินงานออกไปอย่างไม่มีกำหนด อาทิเช่น การปิดบริการคลินิกผิวหนังและคลินิกเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ.2564 จนถึงปัจจุบัน ปรับมาเป็นการให้บริการคลินิกโรคทางเดินหายใจ (ARI Clinic) และคลินิกให้บริการวัคซีน Covid-19 การส่งบุคลากรเข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรต่างๆ รวมถึงการพัฒนาศักยภาพเครือข่ายเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงาน ถูกเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด

2. การเบิกจ่ายงบประมาณที่ไม่เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากในหลายกิจกรรมไม่สามารถดำเนินการได้ และจำเป็นต้องเลื่อนออกไปอย่างไม่มีกำหนด และมีความจำเป็นในการปรับงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานเพื่อตอบโต้ Covid-19 และเพื่อสนับสนุนระบบบริหารจัดการภายในหน่วยงาน เนื่องจากมีความจำเป็นในการใช้ทรัพยากร ยา เวชภัณฑ์ วัสดุวิทยาศาสตร์ ที่จำเป็น ในการเฝ้าระวังตอบโต้โควิด-19

3. การยกระดับศูนย์ปฏิบัติการภาวะฉุกเฉิน กรณีการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 เป็นระดับสูงสุด จึงจำเป็นต้องระดมสรรพกำลังของหน่วยงานเกือบทั้งหมดเพื่อเข้าร่วมในการปฏิบัติงานทั้งภายในหน่วยงานที่เปิดให้บริการคลินิกโรคทางเดินหายใจ ในการตรวจคัดกรองประชาชนกลุ่มเสี่ยง หรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูง การออกปฏิบัติงานภาคสนามในพื้นที่ที่มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 การสอบสวนโรคเพื่อการควบคุมป้องกันโรค การค้นหาเชิงรุกในชุมชน ด้วยทีม CRRT การเปิดให้บริการดูแลรักษาผู้ป่วยที่บ้าน Home Isolation เนื่องจากผู้ป่วยมีจำนวนมากกว่าจำนวนเตียงในระบบ ส่งผลให้บทบาทในการปฏิบัติงานประจำภายในหน่วยงานลดลง และการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติราชการไม่เป็นไปตามเป้าหมาย



5.2 ข้อเสนอแนะการดำเนินโครงการ

ข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาลุทธิที่เกิดขึ้น มีรายละเอียดดังนี้

1. จากสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ระลอก 2 และ 3 ส่งผลกระทบต่อแผนการการดำเนินโครงการที่วางไว้ นั้นควรแก้ไขปัญหาลุทธิโดยการปรับปรุงแบบการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบออนไลน์มากยิ่งขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ พร้อมทั้งนำปัญหาลุทธิที่เกิดขึ้นมาเป็นจุดแข็งที่สามารถช่วยให้การดำเนินโครงการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยปรับปรุงแบบโครงการหรือกลุ่มเป้าหมายการดำเนินงานให้สอดคล้องกับสถานการณ์การระบาดของ Covid-19 อาทิ การพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครต่างดาว เพื่อเป็นตัวกลางในการขับเคลื่อนงานเฝ้าระวังป้องกันควบคุม Covid-19 ในกลุ่มประชากรต่างดาว ซึ่งเป็นกลุ่มที่พบการติดเชื้อเป็นจำนวนมากในการระบาดระลอกที่ 2 การพัฒนาอาสาสมัครชุมชน ในการเป็นผู้นำในการสอดส่องดูแลและประสานงานเพื่อให้ประชาชนในชุมชนที่มีความเสี่ยง หรือเป็นผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ที่ยังไม่ได้เข้าสู่ระบบการรักษา ได้เข้าสู่กระบวนการในการตรวจยืนยันทางห้องปฏิบัติการ การเข้าสู่ระบบการดูแลแบบ Community Isolation
2. การวางแผนปฏิบัติราชการในปีงบประมาณ 2565 ควรแบ่งลักษณะงานออกเป็นในรูปแบบของ COVID-19 และ Non-COVID-19 รวมถึงการปรับปรุงแบบการดำเนินงานให้เป็นรูปแบบ Online มากยิ่งขึ้น เพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นจากการไม่สามารถจัดประชุม หรือ ลงพื้นที่เพื่อดำเนินการได้ รวมถึงการบริหารจัดการกำลังคน ให้สามารถดำเนินงานเพื่อการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรค Covid-19 ไปพร้อมๆ กับการดำเนินงานตามภารกิจหลักขององค์กรเพื่อให้เกิดการดำเนินงานที่ต่อเนื่องต่อไปได้





กรมควบคุมโรค
Department of Disease Control

กลุ่มยุทธศาสตร์ และพัฒนาองค์กร
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง กรมควบคุมโรค
24/56 ถนนพหลโยธิน แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 0-2521-0943 **โทรสาร** 0-2521-0936
iudc.strategy@gmail.com
